


สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีเดือน เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แบน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		ค่าควา แกร่งจริง	หมายเหตุ
												วัน (%)	เงิน (%)		
1	ปรับปรุงอาคารเรียนห้องสมุดสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 งาน	18/2563	9/4/2563	17/4/2563	15/6/2563	60	475,000	13	47	21.67	0.00	-	21.67		
2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 งาน	15/2563	23/3/2563	25/3/2563	8/5/2563	45	162,000	36	9	80.00	100.00	20.00	-		
3	ก่อสร้างโรงรับผูกพืชผลเกษตรและคังคังไก่ จำนวน 1 งาน	13/2563	25/3/2563	31/3/2563	28/6/2563	90	370,000	30	60	33.33	15.00	-	18.33		
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกดอกบานไม่รู้รุย) จำนวน 1 งาน	11/2563	9/4/2563	14/4/2563	12/7/2563	90	584,500	16	74	17.78	0.00	-	17.78		
5	ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่สวนวัน	8/2563	18/3/2563	23/3/2563	21/5/2563	60	340,000	38	22	63.33	100.00	36.67	-		
6	ก่อสร้างรั้วรอบขอบชิดเชิงเขา จำนวน 1 งาน	14/2563	19/3/2563	23/3/2563	20/6/2563	90	800,000	38	52	42.22	30.00	-	12.22		
7	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลราชภัฏ จำนวน 1 งาน	7/2563	18/3/2563	19/3/2563	17/5/2563	60	400,000	42	18	70.00	100.00	30.00	-		
8	ก่อสร้างงานระบบ จำนวน 1 งาน	12/2563	2/4/2563	7/4/2563	5/7/2563	90	870,000	25	67	25.56	0.00	-	25.56		
9	ปรับปรุงอาคาร สโมสรชม 1,2 จำนวน 1 งาน	17/2563	30/4/2563	30/4/2563	26/9/2563	150	1,740,000	0	150	-	0.00	-	-		
10	ปรับปรุงทางเดินอาคารโรงพยาบาลใหม่ จำนวน 1 งาน	22/2563	30/4/2563	30/4/2563	28/7/2563	90	999,545	0	90	-	0.00	-	-		
11	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน	16/2563	16/4/2563	16/4/2563	25/8/2563	132	999,545	14	118	10.61	0.00	-	10.61		

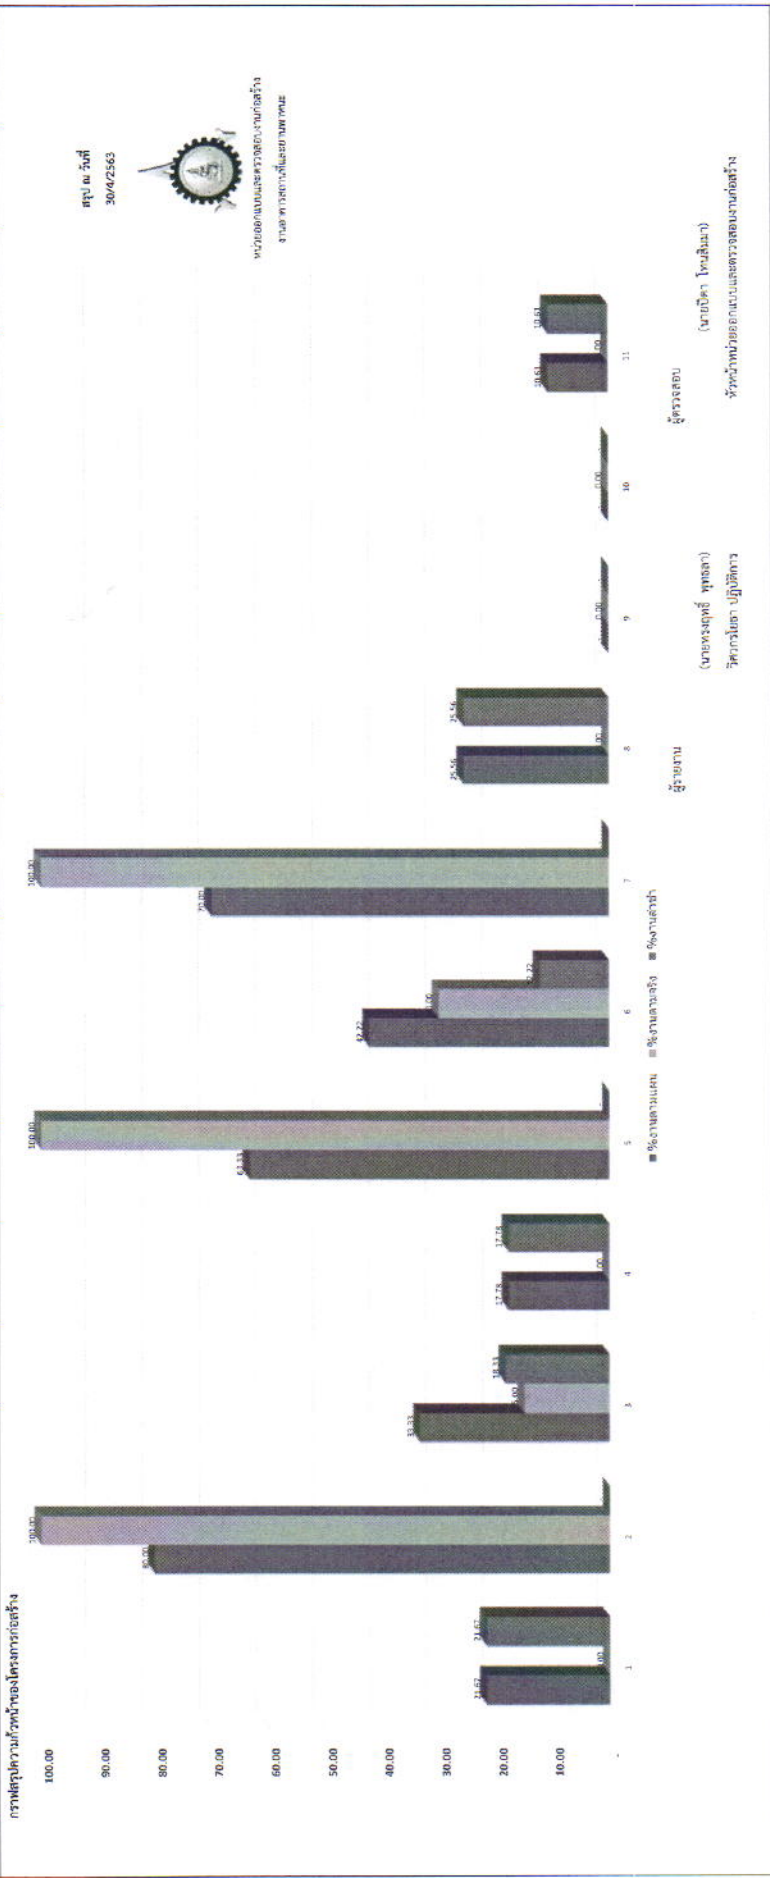

สรุป ณ วันที่ 30/4/2563

หน่วยงานต้นแบบและตรวจของงานก่อสร้าง
 งานช่างโยธาและสถาปัตย์
